

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL'ARTE
Rilasciata al committente dall'impresa installatrice

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

La sottoscritta DESIREE SCORPIONI legale rappresentante dell'impresa ENTRAINCITTA S.R.L. operante nel settore TELECOMUNICAZIONI con sede in Via ANTONIO SILIGATO, SNC, 00053 – CIVITAVECCHIA (RM) tel.+39 0766 1916014, part. IVA11043971008

☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di ROMAn. 1274971

☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di
n esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: Provincia di Livorno adibito ad uso:

☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- foto di impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità apparati installati;
- copia visura camerale società.

Allegati facoltativi:

NESSUNO

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 29/07/2022

Il responsabile tecnico
EntrainCitta' s.r.l.
Via Sofia De Filippi Mariani, 1
00053 Civitavecchia (RM)....
CF e P.IVA: 11043971008
(timbro e firma)

Il dichiarante
EntrainCitta' s.r.l.
Via Sofia De Filippi Mariani, 1
00053 Civitavecchia (RM)
CF (timbro e firma) 11043971008

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

La sottoscritta DESIREE SCORPIONI, legale rappresentante dell'impresa ENTRAINCITTA S.R.L. esecutrice dell'impianto elettrico installato nelle sezioni descritte come da Capitolato Tecnico della Provincia di Livorno: "Progetto europeo LOSE+ Logistica e Sicurezza del trasporto merci, Progetto multi-azione sulla gestione merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell'area di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 2014-2020", di seguito elencati:

DICHIARA

di aver utilizzato materiali e componenti conformi alle normative vigenti e che gli stessi possiedono marchi, certificati di conformità alle norme di riferimento o, comunque, conformi alla regola dell'arte come da dichiarazione del costruttore. Le documentazioni rilasciate dai fornitori e/o costruttori sono conservate presso la nostra sede amministrativa in VIA SOFIA DE FILIPPI MARIANI, 1 - CIVITAVECCHIA (RM).

Elenco componenti

Componente (**)	Modello, tipo o sigla (**)	Costruttore (**) (***)	Conforme alla regola dell'arte (*)		
			CE	IMQ	Altra documentaz. (****)
17 telecamere comprese staffe da palo	TS 3MPX	Targa System	X		
7 antenne LTE	SXT LTE	Mikrotik	X		
2 router LTE	RB912UAG-5HPnd	Mikrotik	X		
7 alimentatori	TOP-R 205BC	Mcroset	X		
2 switch 8 porte	TL-SG108	TP LINK	X		
6 switch 5 porte	D-LINK DGS-105	TP LINK	X		
7 armadi	IP66 BOX	Bocchiotti	X		
12 batterie	AGM 40 AMP	Syrio Power	X		

2 batterie	GEL DEEP CYCLE 200 AMP	Syrio Power	X		
2 pannelli fotovoltaici	375WPCS3L-375MS	CanadianSolar	X		
1 regolatore carica	Blue Solar MPPT-100/50 100VOC 50A	Victron Energy	X		

(*) Barrare le caselle relative

(**) Gli accessori elettrici di largo impiego (ad esempio capicorda, pressacavo, connettori, morsetti, ecc.) possono essere genericamente indicati come accessori vari di montaggio, senza indicazione del modello, del tipo o della sigla e del nome del costruttore

(***) L'indicazione del nome del costruttore è facoltativa per quei componenti elettrici, quali cavi, tubi protettivi, canali ecc., di costruttori diversi che vengano utilizzati per uno stesso impianto

(****) Se i componenti elettrici non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte ai sensi dell'art.5 del DPR 447/91, e deve conservarla per un periodo di 10 anni

4

☐ Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dall'art.7 della Legge 46/90

☒ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzati, essendo considerati rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

Installazione:

- Pali rastremati 6 mt con plinto armato
- Canalizzazioni in acciaio inox
- Cavidotti interrati con canalizzazioni

Civitavecchia, 29/07/2022

EntrainCitta' S.r.l.
 Via Sofia de Filippi Mariani, 1
 00053 Civitavecchia (RM)
 C.F. e P.IVA: 11043971008

RELAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI PER PROGETTO LOSE+



In relazione a quanto in oggetto siamo ad inviarVi una relazione delle attività svolte sulle Sezioni comprensive il progetto.

Come da Capitolato, tutte le sezioni sono state completate come riportato di seguito:

SEZ.1LIVORNO S.G.C. FI-PI-LI KM 78,200 Direzione Firenze

– Realizzazione canalizzazione e cablaggio, installazione armadietto, installazione di n. 2 telecamere con puntamento.

Attivazione rete internet con relativo collegamento su server In Cloud.

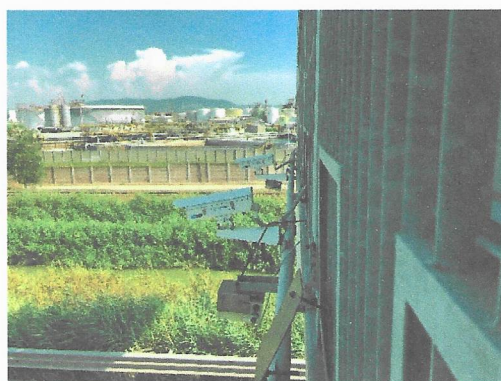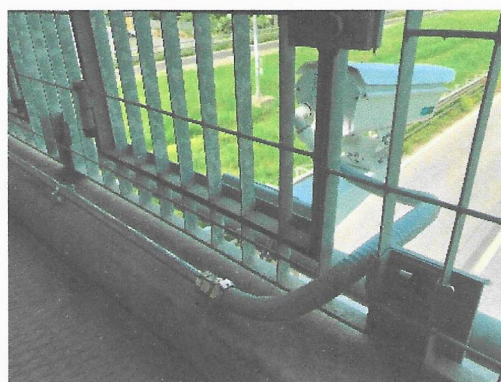


SEZ.2 LIVORNO S.G.C. FI-PI-LI KM 79,620 Direzione Livorno/Darsena

– Attrezzato il cantiere stradale ed utilizzato un cestello meccanizzato, realizzazione canalizzazione e cablaggio, installazione armadietto, installazione n. 3 telecamere con puntamento.
Realizzato impianto fotovoltaico e attivazione rete internet con relativo collegamento su server In Cloud.



SEZ.3 LIVORNO VIA L. DA VINCI Bidirezionale




– Realizzazione scavo e plinto armato con installazione di nuovo palo rastremato alto mt. 6, installazione di n. 01 pozzetto sotto il palo, passaggio di cavo elettrico da armadio stradale a palo di mt. 480, realizzazione canalizzazione e cablaggio, installazione armadietto, installazione n. 2 telecamere con puntamento. Attivazione rete internet con relativo collegamento su server In Cloud.

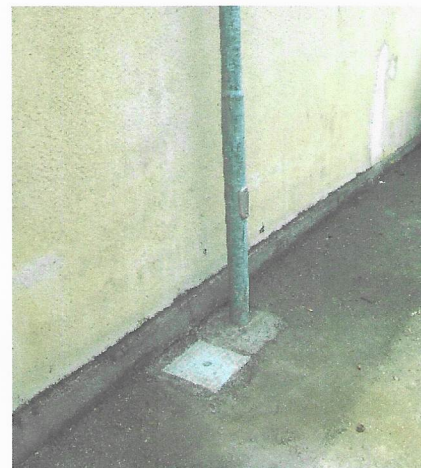

SEZ. 4 PIOMBINO VIALE DELLA RESISTENZA Bidirezionale

- Canalizzazione da armadio stradale a palo d'illuminazione stradale preesistente, installazione armadietto, cablaggio interno, installazione e puntamento di n. 2 telecamere.



Attivazione rete internet con relativo collegamento su server In Cloud.

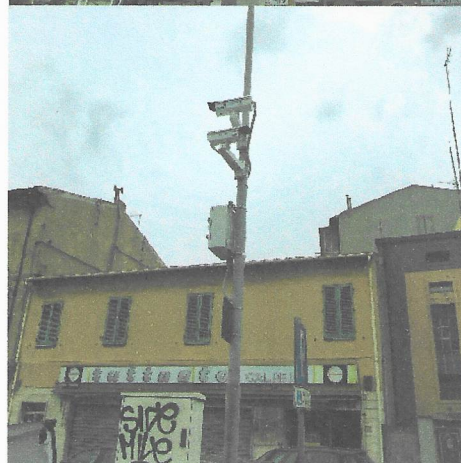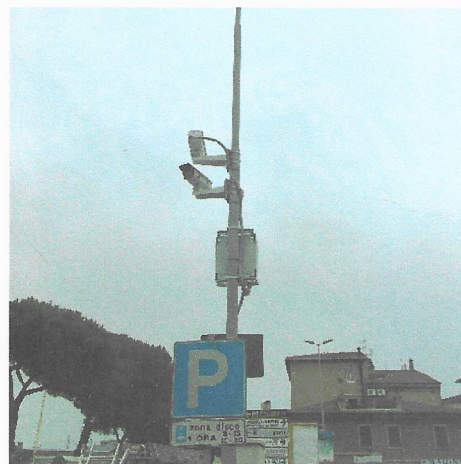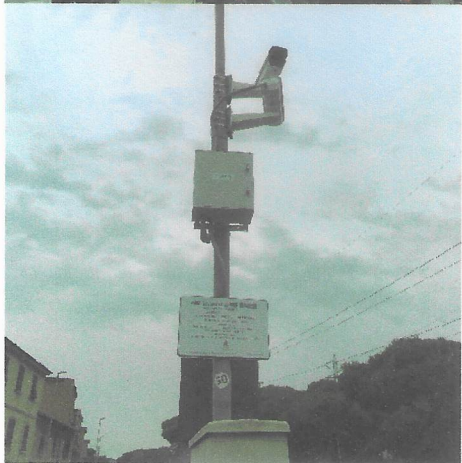

SEZ. 5-6 PORTOFERRAIO SP24 Ingresso porto/ Uscita porto


– Realizzazione di due scavi con plinti armati e posa in opera di due pali rastremati alti mt. 6, realizzazione di scavo e canalizzazione da armadio stradale Enel fino ai pali, installato due armadietti con cablaggio interno ed installato n. 2 telecamere per palo con relativo puntamento.

Attivazione rete internet con relativo collegamento su server In Cloud.

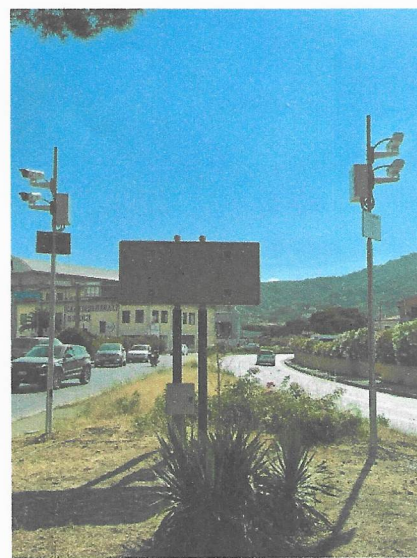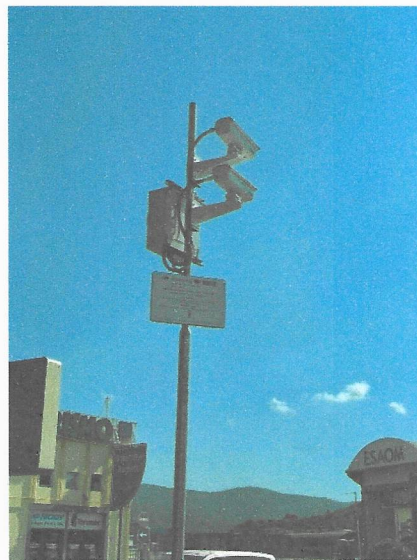



SEZ. 7 CAPRAIA VIA ASSUNZIONE Bidirezionale

- Canalizzazione da pozzetto a palo d'illuminazione stradale preesistente per passaggio cavo elettrico fino ad armadietto, installazione armadietto, cablaggio interno, installazione e puntamento di n. 2 telecamere. Attivazione rete internet con relativo collegamento su server In Cloud.

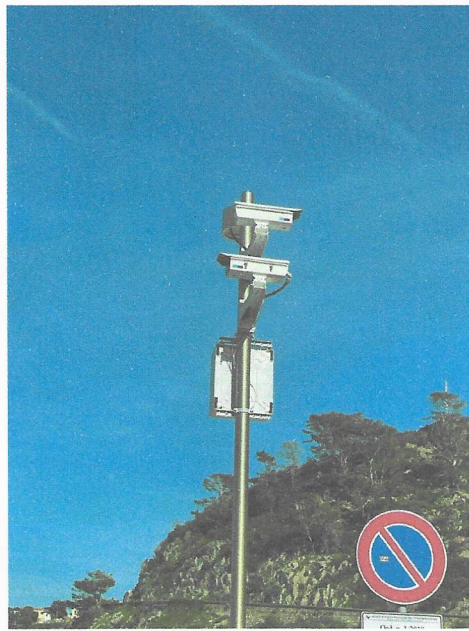

SEZ. 8 LIVORNO VIA L. DA VINCI N. 186 Bidirezionale

- Realizzazione di nuovo impianto di canalizzazione e sostituzione delle due telecamere presenti con le nuove e relativo puntamento.
Attivazione rete internet con relativo collegamento su server In Cloud.

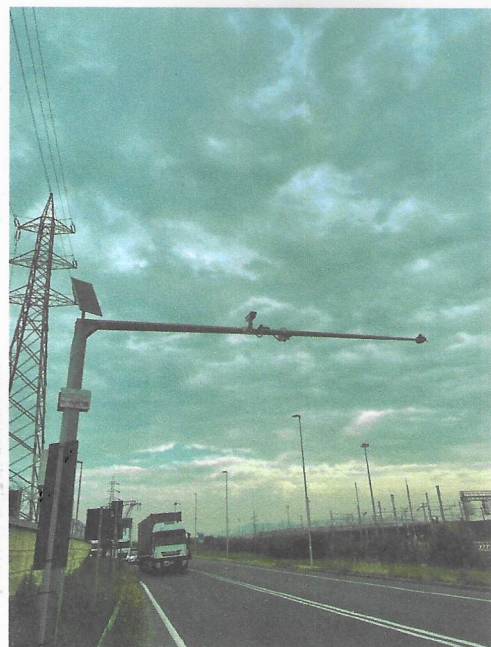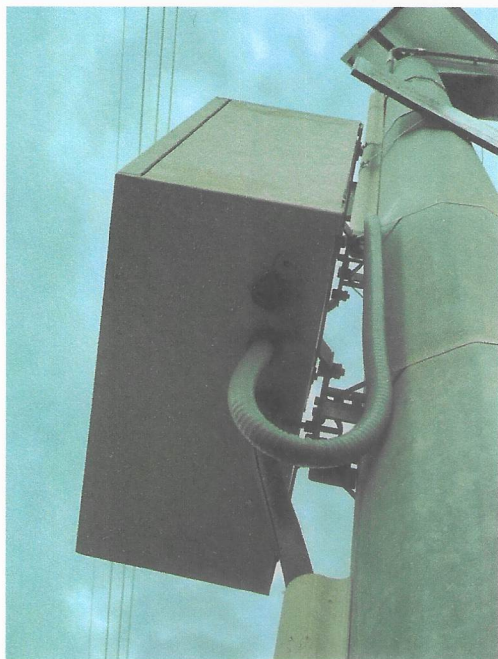

SALA OPERATIVA LIVORNO Sede della Provincia

- Installato nuovo monitor 32 pollici su computer presente in sede, configurato il collegamento In Cloud per la visualizzazione di tutte le telecamere.
Il sistema è completamente configurato e pronto all'uso.

EntrainCitta S.r.l.

Via Sofia de Filippi Mariani, 1 - 00053 Civitavecchia (RM)
tel.: +39 06 95550940 | +39 0766 1916009 | fax: +39 0766 1911007 - info@entraincitta.it - www.entraincitta.it - www.ipernetadsl.it
C.F. e P.I.: IT11043971008 - REA: RM1274971 - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. - Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 n. 413/14-Q
Società di Telecomunicazioni - ISP - WISP autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni ed AGCOM con ROC n. 23377

PMV N.1 CASTELLINA MARITTIMA SR206-Strada regionale Pisana Livornese (Loc. Malandrone)

- Come da Capitolato il pannello è stato completamente ripristinato, collegato ad internet e pronto per essere gestito.



1:
—

PMV N. 2 COLLESALVETTI SR206-Strda Pisana Livornese (Loc. San Martino)

- Come da Capitolato il pannello è stato completamente ripristinato, collegato ad internet e pronto per essere gestito.



Civitavecchia, 29/07/2022

EntrainCitta s.r.l.
Via Sofia de Filippi Mariani, 1
00053 Civitavecchia (RM)
CF e P.IVA: 11043971008
